



LAPORAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

NOMOR : IPP/LP-AKN/4392/V/2024

**PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park
PT. Lipe Metal industry
Area Stock Chamber 17/18 Smelter E**

**INSTALASI PENYALUR PETIR
SANGKAR KONDUKTOR (SYSTEM FARADAY)
IPP - 05**



PT. AKHTAR KARYA NUSA

**PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG PENGUJIAN
DAN PEMERIKSAAN TEKNIK**

HEAD OFFICE : JL. A.W. Syahrani KM. 06 Gang Sukamaju RT. 46 No. 87 Desa Sangatta Utara Kecamatan
Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur – Kode Pos 75683 – Indonesia

Email : akhtarkaryanusa@gmail.com

Phone / Whatsapp : 0549 2031598 / 08158627050 - 082318668386



DATA INSPECTION REPORT

Owner	:	PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park	Report No	:	IPP/LP-AKN/4392/V/2024
Jenis Unit	:	Instalasi Penyalur Petir 05	Tanggal Uji	:	09 February 2026
No ID	:	IPP - 04	Lokasi	:	Area Stock Chamber 17/18 Smelter E
Grounding	:		Pemakai	:	PT. Lipe Metal industry

DASAR HUKUM

1. UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA.
2. UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.
3. PP NO. 50 TAHUN 2012 TENTANG SYSTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3).
4. PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN RI NO. 31 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NO. PER.02/MEN/1989 TENTANG PENGAWASAN INSTALASI PENYALUR PETIR.
5. PERMENAKER NO. 02/MEN/1992 TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN, KEWAJIBAN DAN WEWENANG AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.
6. PERMENAKER NO. 04/MEN/1995 TENTANG PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (PJK3).



DATA INSPECTION REPORT

Owner	:	PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park	Report No	:	IPP/LP-AKN/4392/V/2024
Jenis Unit	:	Instalasi Penyalur Petir 05	Tanggal Uji	:	09 February 2026
No ID	:	IPP - 04	Lokasi	:	Area Stock Chamber 17/18 Smelter E
Grounding	:		Pemakai	:	PT. Lipe Metal industry

DATA UMUM

1	Nama Perusahaan	:	PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park
2	Alamat	:	Site Tanjung Ulie Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah Prov. Maluku Utara
3	Pemakai	:	PT. Lipe Metal industry
4	Pengurus / Penanggung Jawab	:	Iwan Kurniawan
5	Jabatan	:	General Manager HSE
6	Lokasi Unit	:	Area Stock Chamber 17/18 Smelter E
7	Jenis Pemeriksaan	:	pertama
8	Tanggal Riksa Uji	:	09 February 2026
9	Riksa Uji Berikutnya	:	September 2026

DATA TEKNIS

1	Merk / Type	:	Sangkar Konduktor (System Faraday)
2	Pabrik Pembuat	:	Lokal Kontraktor
3	Nomor Seri / No. Unit / ID	:	IPP - 04
4	Tempat / Tahun Pembuatan	:	
5	Jumlah Penerima	:	Menggunakan Struktur bangunan Sebagai Penerima
6	Jumlah Sumuran Arde	:	
7	System Pentanahan	:	Ground Rod
8	Resistance Grounding (RG)	:	
9	Radius Proteksi	:	Area Gedung / Bangunan Smelter E

AIR TERMINAL

1	Jenis Air Terminal	:	
2	Tinggi Air Terminal	:	
3	Jumlah Penurunan	:	
4	Keadaan Visual Air Terminal	:	

DOWN CONDUCTOR

1	Jumlah Down Conductor	:	
2	Luas Penampang	:	
3	Tebal Penampang	:	



DATA INSPECTION REPORT

Owner	:	PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park	Report No	:	IPP/LP-AKN/4392/V/2024
Jenis Unit	:	Instalasi Penyalur Petir 05	Tanggal Uji	:	09 February 2026
No ID	:	IPP - 04	Lokasi	:	Area Stock Chamber 17/18 Smelter E
Grounding	:		Pemakai	:	PT. Lipe Metal industry

EARTH ELECTRODE

- 1 Jenis Elektroda Bumi (Batang/Rod, Pita, Mesh) :
- 2 Diameter Penampang :
- 3 Kedalaman Elektroda :
- 4 Jarak Antara Elektroda Bumi satu dengan yang lain :

ALAT PENGAMAN DAN PERLANGKAPAN LAINNYA :

- 1 Grounding Rod : ada/baik
- 2 Box Control : ada/baik
- 3 Pengaman Kabel Hantaran : ada/baik
- 4 Recorder : ada/baik
- 5 Clam Cable : ada/baik
- 6 Scun Cable : ada/baik
- 7 Dan lain-lain :

PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

1 REVIEW DOKUMEN

Dokumen yang direview meliputi antara lain data pembuatan Instalasi Penyalur Petir, pengawasan pembuatan pengujian penyalur petir, lembar pengesahan gambar rencana, perhitungan kekuatan konstruksi, laporan uji tidak merusak.

2 PENGUKURAN

Perhitungan dilakukan sesuai data actual pada saat melakukan pemeriksaan lapangan.

3 PEMERIKSAAN VISUAL

Pemeriksaan visual dilakukan pada penyalur petir serta pada bagian yang dianggap kritis, hasilnya tidak ditemukan adanya kelainan pada penyalur petir hasil pengukuran tidak melebihi yang diizinkan.

4 PERALATAN YANG DIGUNAKAN

- a. Digital Earth Tester.
- b. Clamp Earth Tester Ground.



DATA INSPECTION REPORT

Owner	:	PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park	Report No	:	IPP/LP-AKN/4392/V/2024
Jenis Unit	:	Instalasi Penyalur Petir 05	Tanggal Uji	:	09 February 2026
No ID	:	IPP - 04	Lokasi	:	Area Stock Chamber 17/18 Smelter E
Grounding	:		Pemakai	:	PT. Lipe Metal industry

VISUAL INSPECTION REPORT

CONDITION OF	Kondisi		Keterangan
	Baik/ada	Buruk/tidak ada	
EXTERNAL			
A. PENERIMA			
Jenis Penerima	☒	☐	
Jarak/Radius Proteksi	☒	☐	
Tinggi Air Terminal	☒	☐	
Jumlah dan Jarak Terminal (Berkarat/Tidak)	☒	☐	
Gambar Bentuk Atap dan Ukurannya	☒	☐	
B. PENGHANTAR PENURUNAN			
Jumlah Down Conductor	☐	☒	
Jarak Antar Kaki Penerima dan Titik Luas Penampang	☐	☒	
Tebal Penampang	☐	☒	
Jarak Antar Penghantar Penurunan Dengan lain	☐	☒	
Tinggi Bangunan	☐	☒	
Luas Bangunan	☐	☒	
C. PEMBUMIAN			
Jenis Electroda Bumi (Batang/Rod, Pita, Mesh)	☒	☐	
Diameter Penampang	☒	☐	
Kedalaman Electroda	☒	☐	
Luas Penampang	☒	☐	
Jarak Antar Electroda Bumi Satu dengan yang lain	☒	☐	

PT. AKHTAR KARYA NUSA

Jl. A.W. Syahrane KM. 06 GG. Sukamaju RT.46 No.87 Sangatta Utara, Kutai Timur – Kalimantan Timur

Hp. 082158627050, 082214564821, 082318668386 / 0549-2031598 Email : akhtarkaryanusa@gmail.com



DATA INSPECTION REPORT


Owner	:	PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park	Report No	:	IPP/LP-AKN/4392/V/2024
Jenis Unit	:	Instalasi Penyalur Petir 05	Tanggal Uji	:	09 February 2026
No ID	:	IPP - 04	Lokasi	:	Area Stock Chamber 17/18 Smelter E
Grounding	:		Pemakai	:	PT. Lipe Metal industry

D. KONDISI MATERIAL

Air Terminal Klem, Baut & Penyangga	☒	☐	
Penghantar Daerah Atap Klem, Baut & Penyangga	☒	☐	
Kotak Hubung/Bak Kontrol Klem, Baut	☒	☐	
Akar/Batang Pembumian Klem, Baut Penghantar Akar ke Akar	☒	☐	

E. KONDISI PEMASANGAN SAMBUNGAN

Sambungan Kepala Air Terminal	☒	☐	
Klem, Baut dan Penyangga	☒	☐	
Sambungan Hantaran Penurunan (Down Conductor) ke Kepala Penangkal	☒	☐	
Sambungan Hantaran Penurunan (Down Conductor) ke Hantaran	☒	☐	
Sambungan Hantaran Penurunan (Down Conductor) Ke Kotak Hubung (Bak Kontrol)	☒	☐	
Sambungan Hantaran Penurunan (Down Conductor) Ke Pembumian	☒	☐	

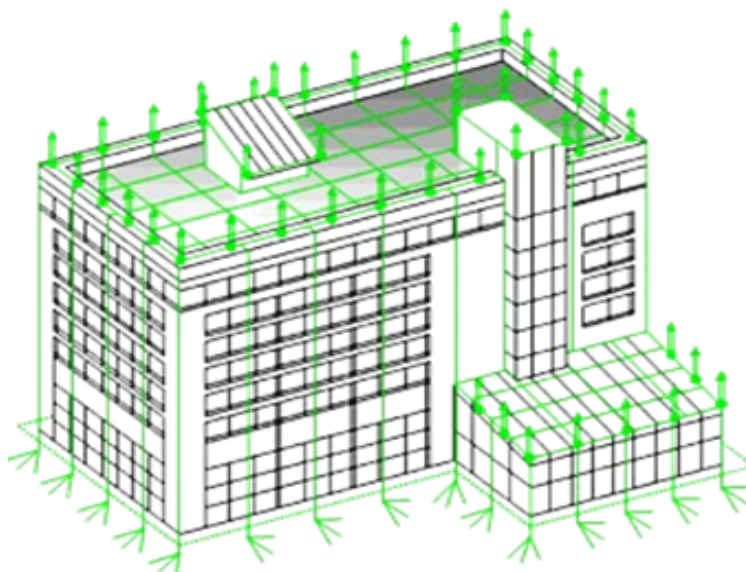

Visual System Faraday (Sangkar Konduktor)

PT. AKHTAR KARYA NUSA

Jl. A.W. Syahrane KM. 06 GG. Sukamaju RT.46 No.87 Sangatta Utara, Kutai Timur – Kalimantan Timur


Hp. 082158627050, 082214564821, 082318668386 / 0549-2031598 Email : akhtarkaryanusa@gmail.com



DATA INSPECTION REPORT

Owner	:	PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park	Report No	:	IPP/LP-AKN/4392/V/2024
Jenis Unit	:	Instalasi Penyalur Petir 05	Tanggal Uji	:	09 February 2026
No ID	:	IPP - 04	Lokasi	:	Area Stock Chamber 17/18 Smelter E
Grounding	:		Pemakai	:	PT. Lipe Metal industry

EARTH METER TEST INSPECTION REPORT

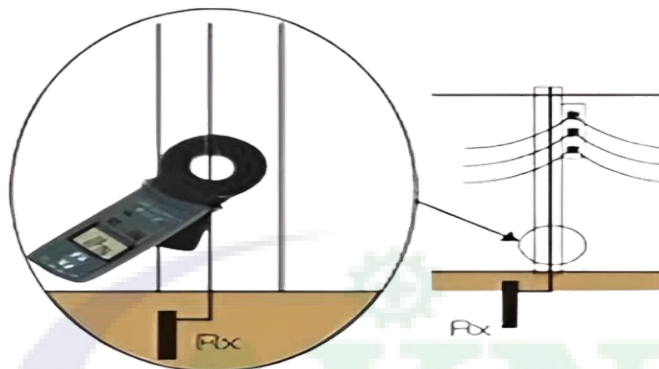

- > Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga kerja No. PER. 02/MEN/1989 pasal 54 ayat 1 Tahanan pbumian (Elektrode Bumi) tidak boleh lebih dari **5 (lima) Ohm (Ω)**.
- > Jika nilai gronding di atas nilai standard yang di ijinan, maka system grounding harus dilakukan perbaikan / di paralel sehingga grounding/pbumian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

ALAT UKUR	HASIL PENGUKURAN	KETERANGAN
		BAIK
	-	
	-	
JENIS : Clamp Earth Ground Tester	standard	5 Ω
MODEL : UNI-T UT275	P1 -----> E -----> P2	BAIK < 5 Ω (Ohm)



DATA INSPECTION REPORT

Owner	:	PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park	Report No	:	IPP/LP-AKN/4392/V/2024
Jenis Unit	:	Instalasi Penyalur Petir 05	Tanggal Uji	:	09 February 2026
No ID	:	IPP - 04	Lokasi	:	Area Stock Chamber 17/18 Smelter E
Grounding	:		Pemakai	:	PT. Lipe Metal industry

KETERANGAN :

TEMUAN :

SYARAT-SYARAT :

1. Penyalur petir harus dapat menyalurkan sambaran petir ke tanah / grond.
2. Pastikan instalasi dari air terminal ke bak control grond tersambung, bersihkan karat/korosi pada instalasi petir, baik busbar, nut/bolt , atau segera mengganti komponen tersebut.
3. Penghantar penurunan atau kabel elektroda harus di pasang mengikuti sudut bangunan atau diberi alur sampai penurunan ke tanah.
4. Standart ukuran kabel elektroda gronding minimal 50 mm². Jangan menggunakan kabel single wire.
5. Nilai pengukuran gronding harus dibawah 5 ohm. Elektroda bumi baiknya ditanam sampai mencapai air dalam bumi. (Pasal 28 ayat 3 & Pasal 54 peraturan intalasi penyalur petir).
6. Instalasi penyalur petir dan menara tidak boleh sepenuhnya dianggap dapat melindungi bangunan-bangunan yang berada disekitannya (pasal 35)
7. Pastikan sambungan penyalur petir dari menara tidak terdapat korosi, lakukan preventif maintenance kebersihan dan perawatan penyalur petir.
8. Setiap instalasi penyalur petir dan bagiannya harus dipelihara agar selalu bekerja dengan tepat, aman dan memenuhi syarat.
9. Kerusakan-kerusakan yang didapati harus segera diperbaiki (pasal 53).



DATA INSPECTION REPORT

Owner	:	PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park	Report No	:	IPP/LP-AKN/4392/V/2024
Jenis Unit	:	Instalasi Penyalur Petir 05	Tanggal Uji	:	09 February 2026
No ID	:	IPP - 04	Lokasi	:	Area Stock Chamber 17/18 Smelter E
Grounding	:		Pemakai	:	PT. Lipe Metal industry

10. Kemampuan Perlindungan Secara Teknis

11. Ketahanan Mekanis

12. Ketahanan Terhadap Korosi

13. Bahan dan Konstruksi harus kuat

14. Sambungan-sambungan harus merupakan sambungan listrik

15. Pemasangan instalasi petir harus dilakukan oleh instalatir yang telah mendapat pengesahan dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya.

16. Tahanan pembumian dan seluruh system pembumian tidak boleh lebih dari 5 Ohm

17. Instalasi Penyalur Petir harus diperiksa dan di uji secara berkala atau setelah adanya perubahan atau perbaikan dan kerusakan akibat sambaran petir oleh Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan atau Jasa Inspeksi yang di tunjuk.

KESIMPULAN :

Diperiksa oleh,
Inspector / Teknisi K3

Diketahui Oleh,
Ahli K3 Listrik / Petir

Diajukan Oleh,
PT. Indonesia Weda Bay Industrial
Park

(Budi)

(.....)

(Iwan Kurniawan)



DATA INSPECTION REPORT

Owner	:	PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park	Report No	:	IPP/LP-AKN/4392/V/2024
Jenis Unit	:	Instalasi Penyalur Petir 05	Tanggal Uji	:	09 February 2026
No ID	:	IPP - 04	Lokasi	:	Area Stock Chamber 17/18 Smelter E
Grounding	:		Pemakai	:	PT. Lipe Metal industry

LAMPIRAN FOTO DOKUMENTASI



Dokumentasi Inspeksi



Dokumentasi Inspeksi



Pengukuran



Dokumentasi Inspeksi

